


Secretaría de Ciencia, tecnología e Innovación

CALIFICACIÓN GESTIÓN DE PROYECTOS
puntos

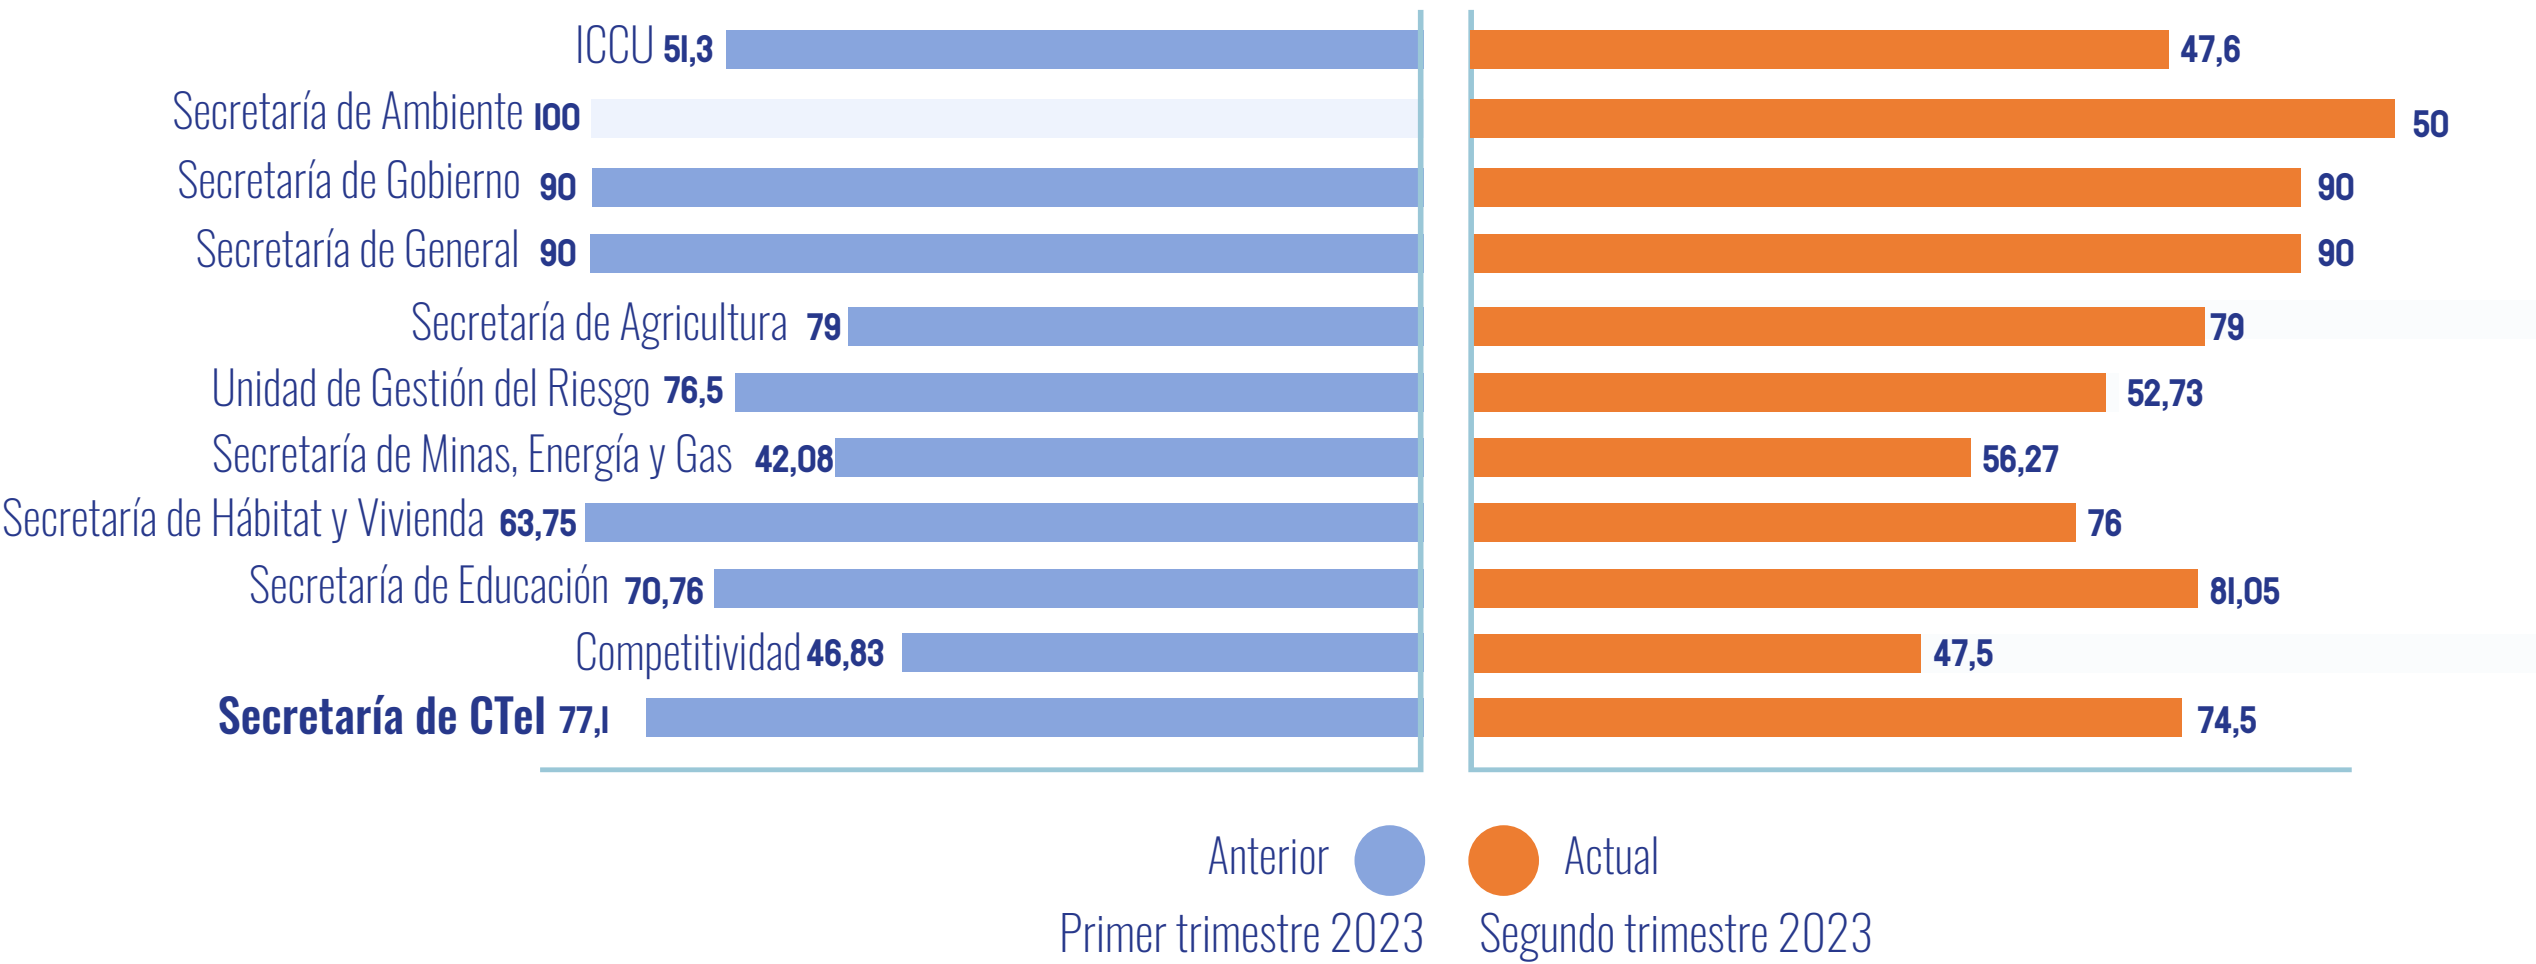

PROYECTOS A CARGO DE LA ENTIDAD


▲ Información corte 15 de octubre 2023



Total
Proyectos
en ejecución

27

Proyectos
pendientes a cierre

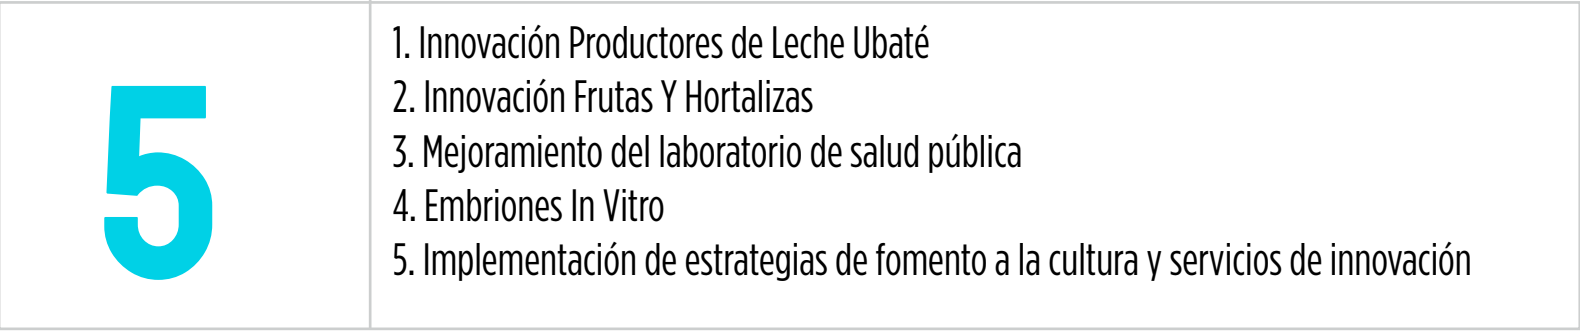


Promedio
puntaje IGPR



Proyectos
en ajuste




*Puntaje anterior 77,1



Estado	Bpim	Nombre	ICPR primer trimestre 2023
Contratado en ejecución	2012000100010	Fortalecimiento de las regiones colombianas en sus capacidades de CTI	90,3
Contratado en ejecución	2012000100144	Investigación desarrollo y transferencia tecnológica en el sector agropecuario y agroindustrial	100
Contratado en ejecución	2013000100129	Estrategias sustentables en el uso del recurso de energía eléctrica	92,3
Terminado	2013000100176	Innovación frutas y hortalizas	90
Terminado	2013000100248	Innovación , ciencia y tecnología para productores de leche en la provincia de Ubaté	90
Terminado	2016000100027	Embriones in vitro	74,8
Contratado en ejecución	2017000100016	Validación y generación de productos derivados de la biodiversidad en el departamento de Cundinamarca	75
Contratado en ejecución	2017000100034	Gestión innovación para la industria	50
Para Cierre	2017000100074	Implementación de estrategias de fomento a la cultura y servicios de innovación	90
Contratado en ejecución	2017000100076	Fortalecimiento de capacidades de gestión del riesgo	70,7
Contratado en ejecución	2017000100087	Formación de talento humano de alto nivel en maestrías	72,8
Contratado en ejecución	2017000100104	Fortalecimiento de la cultura de la gestión y utilización del conocimiento en CTel	89,5
Contratado en ejecución	20170000100012	conformación de una convocatoria regional de proyectos i+d en focos priorizados CTel	45,5
Contratado en ejecución	2018000100160	Formación de capital humano de alto nivel para la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación maestrías	50
Contratado en ejecución	2020000100137	Mejoramiento del laboratorio de salud pública	71,6
Contratado en ejecución	2020000100266	Generación de espacios de encuentro de la sociedad con la ciencia y la tecnología - un viaje con la ciencia	94,8
Contratado en ejecución	2020000100246	Fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva de la guadua por medio de paquetes tecnológicos	100
Contratado en ejecución	2020000100695	Violencia basadas en género	69,8
Contratado en ejecución	2020000100650	Fortalecimiento de capacidades de ctei en los niveles de básica y media, mediante uso de tics en instituciones educativas oficiales	59,3
Contratado en ejecución	2020000100696	Fortalecimiento de capacidades de CTel para la reactivación económica y la transformación productiva	100
Contratado en ejecución	2020000100649	Fortalecimiento de capacidades de CTel para el relacionamiento escuela - contexto rural	100
Contratado en ejecución	2021000100327	Desarrollo de un sistema de producción lechero para la obtención de leches inocuas de alta calidad	50
Contratado en ejecución	2021000100208	Fortalecimiento de los niveles de Apropiación social CTel en comunidades de Almeidas y Ubaté	89,5
Contratado en ejecución	2021000100243	Desarrollo participativo de una plataforma tecnológica de teledetección para la gestión sostenible de suelos	38,8
Contratado en ejecución	2021000100467	Fortalecimiento de las capacidades institucionales para el desarrollo y gestión del ecosistema territorial	55,5
Contratado en ejecución	2021000100276	Modelo de promoción turística sostenible desde la tecnología 4.0 en los municipios de la Palma y Yacopi	44,8
Contratado en ejecución	2021000100523	Desarrollo de microrredes y almacenamiento (ess) prestadores de servicios complementarios	58,8

Proyectos Secretaría de Ciencia, tecnología e Innovación

Proyecto 1



Fortalecimiento de las regiones
**colombianas en sus
capacidades de CTI**

Valor Total

\$ 8.721.806.744

Valor SGR

\$ 8.721.806.744



Código BPIN

2012000100010



Estado

Contratado en ejecución



Recomendaciones

Se sugiere adelantar el proceso de cierre del proyecto a través de la respectiva resolución de cierre dentro del plazo establecido por la normatividad, el cual es de 6 meses.

AVANCE FÍSICO

86,03%



AVANCE FINANCIERO

97,29%



Proyecto 2



Investigación , desarrollo y transferencia tecnológica

**en el sector agropecuario y agroindustrial con el fin de mejorar
todo el departamento, Cundinamarca, Centro Oriente**



Código BPIN

2012000100144



Estado

Contratado en ejecución



Recomendaciones

Este proyecto debe ponerse al día con el reporte de información de ejecución de los meses de octubre de 2022 a la fecha, en el aplicativo Gesproy, es importante conocer desde su despacho si existe alguna situación particular que no permita el diligenciamiento de esta información, y si obedece a suspensiones adelantar las gestiones pertinentes para continuar con la normal ejecución.

AVANCE FÍSICO

84,33%



AVANCE FINANCIERO

82,17%



Valor Total

\$ 50.514.736.439

Valor SGR

\$ 34.707.000.000

Proyecto 3



Estrategias sustentables

en el uso del recurso de energía eléctrica

Valor Total

\$ 5.264.002.961

Valor SGR

\$ 4.097.083.299



Código BPIN

2013000100129



Estado

Contratado en ejecución



Recomendaciones

Se recomienda completar el reporte de beneficiarios y sostenibilidad del proyecto en el aplicativo Gesproy, tambien se sugiere adelantar el proceso de cierre del mismo a través de la respectiva resolución de cierre, teniendo en cuenta que la fecha de terminación del proyecto es del 31 de Octubre 2022 y el plazo establecido por la normatividad es de 6 meses.

AVANCE FÍSICO

82,42%



AVANCE FINANCIERO

68,52%



Proyecto 4



Innovación frutas y hortalizas



Código BPIN
2013000100176



Estado
TERMINADO

AVANCE FÍSICO

100%



Valor Total
\$ 9.285.096.292

AVANCE FINANCIERO

68,71%



Valor SGR
\$ 6.556.945.302



Recomendaciones

El proyecto presenta dos alertas en aplicativo Gesproy debido a que existe cargue de información incompleta con respecto a los procesos precontractuales, por tanto se recomienda realizar las gestiones pertinentes para subsanarlas, también es necesario completar el reporte de beneficiarios, sostenibilidad y alcance del proyecto en el mismo aplicativo, por último se evidencia que esta pendiente realizar y/o registrar los pagos y liquidación para el respectivo balance financiero, los cuales son necesarios para realizar el cierre del proyecto, teniendo en cuenta que la fecha de terminación del proyecto es del 30 de Junio 2021 y el plazo establecido por la normatividad para el cierre del proyecto es de 6 meses, se sugiere adelantar el proceso de cierre del mismo a través del acto administrativo de cierre.

Proyecto 5



Innovación, ciencia y tecnología para productores de leche en la provincia de Ubaté



Código BPIN
2013000100248



Estado
TERMINADO

AVANCE FÍSICO

80,25%



AVANCE FINANCIERO

81,97%



Valor Total
\$ 11.619.725.567

Valor SGR
\$ 9.380.319.099



Recomendaciones

La fecha de terminación del proyecto es del 31 de Enero 2019, teniendo en cuenta el plazo establecido por la normatividad para el cierre del proyecto es de 6 meses, se sugiere adelantar el balance financiero del proyecto para proceder con el cierre del mismo.

Proyecto 6



Embriones in vitro



Código BPIN
2016000100027



Estado
Terminado

AVANCE FÍSICO

100%



AVANCE FINANCIERO


99.67%



Recomendaciones

La fecha de terminación del proyecto es del 31 de Enero 2019, teniendo en cuenta el plazo establecido por la normatividad para el cierre del proyecto es de 6 meses, se sugiere allegar el acto administrativo de cierre con los soportes y ajustes solicitados.

Proyecto 7



Validación y generación de productos
**derivados de la biodiversidad en el
departamento de cundinamarca**

Valor Total

\$ 4.825.004.077,98

Valor SGR

\$ 4.664.086.788,17



Código BPIN
2017000100016



Estado
Contratado en ejecución



Recomendaciones

Se recomienda completar información de procesos precontractuales y contractuales en el aplicativo Gesproy. La fecha de terminación del proyecto es del 31 de diciembre 2022, teniendo en cuenta el plazo establecido por la normatividad para el cierre del proyecto es de 6 meses, se sugiere adelantar el balance financiero del proyecto para proceder con el cierre del mismo.

AVANCE FÍSICO

79,62%



AVANCE FINANCIERO

96,06%



Proyecto 8



**Gestión innovación
para la industria**

Valor Total

\$ 3.925.471.448

Valor SGR

\$ 3.714.407.118



Código BPIN
2017000100034



Estado
Contratado en ejecución



Recomendaciones

Según lo programado en el aplicativo Gesproy este proyecto se encuentra en ejecución y su fecha de terminación fue el 24 de noviembre de 2021, se sugiere adelantar las gestiones de terminación y cierre ya que se está sobrepasando el termino establecido por la normatividad que es de seis meses. A este respecto deben verificar que todos los indicadores de producto presenten el 100% de ejecución ya que tienen algunos que no están al 100%.

AVANCE FÍSICO

99,21%



AVANCE FINANCIERO

94,18%



Proyecto 9



Implementación de estrategias
**de fomento a la cultura y servicios
de innovación**

Valor Total

\$ 6.183.633.276

Valor SGR

\$ 5.533.633.276



Código BPIN
2017000100074



Estado
para cierre



Recomendaciones

Se sugiere adelantar el proceso de cierre del mismo a través de la respectiva resolución de cierre, teniendo en cuenta que la fecha de terminación del proyecto es del 31 de Octubre 2022 y el plazo establecido por la normatividad es de 6 meses.

AVANCE FÍSICO

100%



AVANCE FINANCIERO

99,71%



Proyecto 10



Fortalecimiento de capacidades
de gestión del riesgo

Valor Total

\$ 4.404.970.720

Valor SGR

\$ 4.000.000.000



Código BPIN
2017000100076



Estado
Contratado en ejecución



Recomendaciones

Este proyecto presenta información incompleta en los procesos contractuales, contratos y el registro de las actas que detallen la situación actual.

Se recomienda realizar el reporte de información de la ejecución del mes de julio 2023 a la fecha en el aplicativo Gesproy.

AVANCE FÍSICO

80,57%



AVANCE FINANCIERO

96,12%



Proyecto 11



Formación de talento humano
de alto nivel en maestrías

Valor Total

\$ 5.148.022.960

Valor SGR

\$ 5.048.022.960



Código BPIN
2017000100087



Estado
Contratado en ejecución



Recomendaciones

Este proyecto debe completar la información de los procesos precontractuales y contrataos o en su defecto verificar si obedece a duplicidad de contratos y gestionar la eliminación de lo que no corresponda dentro del aplicativo gesproy.

Se recomienda realizar el reporte de información de la ejecución del mes de septiembre 2023 a la fecha en el aplicativo Gesproy

AVANCE FÍSICO

61,65%



AVANCE FINANCIERO



Proyecto 12



Fortalecimiento de la cultura
de la gestión y utilización del conocimiento en CTel

Valor Total

\$ 9.498.967.749

Valor SGR

\$ 7.498.967.749



Código BPIN
2017000100104



Estado
CONTRATADO EN EJECUCIÓN



Recomendaciones

Se recomienda completar el reporte de beneficiarios y sostenibilidad del proyecto en el aplicativo Gesproy, tambien se sugiere adelantar el proceso de cierre del mismo a través de la respectiva resolución de cierre, teniendo en cuenta que la fecha de terminación del proyecto es del 31 de Octubre 2022 y el plazo establecido por la normatividad es de 6 meses.

AVANCE FÍSICO

93,27%



AVANCE FINANCIERO

83,47%



Proyecto 13



Conformación de una convocatoria

Regional de proyectos i+d en focos prioritizados CTel

Valor Total

\$ 7.586.358.670,8

Valor SGR

\$ 7.375.550.629,06



Código BPIN

20170000100012



Estado

Contratado en ejecución



Recomendaciones

Se recomienda completar el reporte de beneficiarios y sostenibilidad del proyecto en el aplicativo Gesproy, tambien se sugiere adelantar el proceso de cierre del mismo a través de la respectiva resolución de cierre, teniendo en cuenta que la fecha de terminación del proyecto es del 31 de Diciembre 2022 y el plazo establecido por la normatividad es de 6 meses.

El proyecto presenta cargue de información incompleta con respecto a los contratos en el aplicativo Gesproy, por tanto se recomienda realizar el cargue de esta información

AVANCE FÍSICO

72,09%



AVANCE FINANCIERO

97,17 %



Proyecto 14



Formación de capital humano

de alto nivel para la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación maestrías



Código BPIN

2018000100160



Estado

CONTRATADO EN EJECUCIÓN

Valor Total

\$ 5.217.415.747

Valor SGR

\$ 3.519.725.709




Recomendaciones

Este proyecto debe realizar el cargue la información del proceso precontractual y contractual en el aplicativo Gesproy.


AVANCE FÍSICO

16,90%



AVANCE FINANCIERO

46,13 %



Proyecto 15



Mejoramiento del laboratorio

de salud pública

Valor Total

\$ 4.506.359.274

Valor SGR

\$ 4.048.003.426



Código BPIN

2020000100137



Estado

Contratado en ejecución



Recomendaciones

El proyecto presenta cargue de información incompleta con respecto a los procesos precontractuales en el aplicativo Gesproy, por tanto se recomienda realizar el cargue de esta información,el mismo debe ponerse al día con el reporte de información de ejecución de los meses de Abril de 2023 a la fecha, en el aplicativo Gesproy.

AVANCE FÍSICO

67,64%



AVANCE FINANCIERO

61,62%



Proyecto 16



Generación de espacios de encuentro
**de la sociedad con la ciencia y la tecnología - un viaje
con la ciencia en el departamento de Cundinamarca**



Código BPIN
2020000100266



Estado
Contratado en ejecución



Recomendaciones

se recomienda ponerse al día con el reporte de información de ejecución de los meses de Junio de 2023 a la fecha, en el aplicativo Gesproy, según lo informó por CTI el convenio finalizó el día 21 de abril del 2023 y actualmente se encuentra en proceso de liquidación. Con respecto a la información que se encuentra en el aplicativo GESPROY esta fue cargada hasta mes de mayo con el 100% de la ejecución física adicional a esto las únicas actividades que se encuentran habilitadas son de apoyos a la supervisión y en esos periodos no había ningún contrato vigente vinculado al proyecto por parte de regalías y por esta razón no se realizara el cargue de información del mes de junio.

AVANCE FÍSICO

88,25%



AVANCE FINANCIERO

87,35%



Valor Total

\$ 2.241.429.590

Valor SGR

\$ 2.218.862.102

Proyecto 17



Fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva
**de la guadua por medio del desarrollo e implementación de
dos (2) paquetes tecnológicos para la generación de
productos con valor agregado en el departamento de
Cundinamarca**



Código BPIN
2020000100246



Estado
CONTRATADO EN EJECUCIÓN



Recomendaciones

Se recomienda ponerse al día con el reporte de información de ejecución de los meses de Junio de 2023 a la fecha, en el aplicativo Gesproy, según lo informó por CTI el convenio finalizó el día 21 de abril del 2023 y actualmente se encuentra en proceso de liquidación. Con respecto a la información que se encuentra en el aplicativo GESPROY esta fue cargada hasta mes de mayo con el 100% de la ejecución física adicional a esto las únicas actividades que se encuentran habilitadas son de apoyos a la supervisión y en esos periodos no había ningún contrato vigente vinculado al proyecto por parte de regalías y por esta razón no se realizara el cargue de información del mes de junio.

AVANCE FÍSICO

100%



AVANCE FINANCIERO

89,85%



Valor Total

\$ 3.144.525.520

Valor SGR

\$ 2.294.345.776

Proyecto 18



Violencia
basadas en género

Valor Total

\$ 3.100.000.000

Valor SGR

\$ 3.000.000.000



Código BPIN
2020000100695



Estado
Contratado en ejecución



Recomendaciones

Este proyecto se encuentra en estado Contratado en ejecución, a la fecha está al día con los procesos de ejecución, precontractual y contractual..

AVANCE FÍSICO

74,11%



AVANCE FINANCIERO

92,04%



Proyecto 19



Fortalecimiento de capacidades de CTel para la innovación educativa en los niveles de básica y media, mediante uso de tics en instituciones educativas oficiales de los municipios no Certificados del departamento de Cundinamarca



Código BPIN
2020000100650



Estado
Contratado en ejecución




Recomendaciones

El proyecto debe ponerse al día con el reporte de información de ejecución de los meses de Agosto de 2023 a la fecha en el aplicativo Gesproy.


AVANCE FÍSICO

30,20%



AVANCE FINANCIERO

14,38%



Valor Total

\$ 10.804.663.122

Valor SGR

\$ 9.999.728.696

Proyecto 20



Fortalecimiento de capacidades de CTel para la reactivación económica y la transformación productiva en Cundinamarca



Código BPIN
2020000100696



Estado
Contratado en ejecución

Valor Total

\$ 7.370.634.083

Valor SGR

\$ 6.974.290.175

AVANCE FÍSICO

81,27%



AVANCE FINANCIERO


95,15 %



Recomendaciones

El proyecto presenta cargue de información incompleta con respecto a los procesos contractuales.

Proyecto 21



Fortalecimiento de capacidades de CTel para el relacionamiento escuela - contexto rural mediante la apropiación y uso de las tic en el municipio de sibaté, departamento de Cundinamarca



Código BPIN
2020000100649



Estado
Contratado en ejecución

Valor Total

\$ 4.292.464.018

Valor SGR

\$ 2.645.464.018

AVANCE FÍSICO

90,68%



AVANCE FINANCIERO

79,49%



Recomendaciones

El proyecto presenta cargue de información incompleta con respecto a los procesos precontractuales en el aplicativo Gesproy, por tanto se recomienda realizar el cargue de esta información

Proyecto 22



Desarrollo de un sistema de producción

lechero para la obtención de leches inocuas de alta calidad y con un perfil lipídico saludable en el departamento de Cundinamarca



Código BPIN
21000100327



Estado
Contratado en ejecución




Recomendaciones

Este proyecto debe ponerse al día con el cargue de información supervisores en el aplicativo Gesproy.

AVANCE FÍSICO

5,16%




Valor del proyecto SGR

\$ 3.833.042.862

AVANCE FINANCIERO


2,61%



Valor SGR.

\$ 3.044.082.702

Proyecto 23



Fortalecimiento de los niveles de Apropiación social del Conocimiento de la CTel

en comunidades de las provincias de Almeidas y Ubaté del Departamento de Cundinamarca



Código BPIN
2021000100208



Estado
Contratado en ejecución



Recomendaciones

El proyecto presenta cargue de información incompleta con respecto a los procesos precontractuales en el aplicativo Gesproy, por tanto se recomienda realizar el cargue de esta información

AVANCE FÍSICO

78,49%



Valor Total

\$ 2.191.964.751

AVANCE FINANCIERO


57,32%



Valor SGR

\$1.839.764.876

Proyecto 24



Desarrollo participativo de una plataforma tecnológica

de teledetección para la gestión sostenible de suelos en agroecosistemas del departamento de Cundinamarca



Código BPIN
2021000100243



Estado
Contratado en ejecución

Valor Total
\$3.042.693.625

Valor SGR

\$ 2.332.094.728

AVANCE FÍSICO

19,76%



AVANCE FINANCIERO

21,79%



Recomendaciones

El proyecto presenta cargue de información incompleta con respecto a los procesos precontractuales en el aplicativo Gesproy, por tanto se recomienda realizar el cargue de esta información.

Proyecto 25



Fortalecimiento de las capacidades institucionales
para el desarrollo y gestión del ecosistema territorial



Código BPIN
2021000100467




Estado
Contratado en ejecución

Valor Total
\$2.801.037.429

Valor SGR
\$ 2.299.692.877


AVANCE FÍSICO

26,82 %



AVANCE FINANCIERO

3,2 %



Recomendaciones

El proyecto debe ponerse al día con el reporte de información de ejecución de los meses de Septiembre de 2023 a la fecha en el aplicativo Gesproy.

Proyecto 26



Modelo de promoción turística
sostenible desde la tecnología 4.0 en los municipios de la Palma y Yacopi

Valor Total
\$ 2.608.055.295

Valor SGR
\$ 2.401.327.735



Código BPIN
2021000100276




Estado
Contratado en ejecución




AVANCE FÍSICO

22,02 %



AVANCE FINANCIERO

27,96 %



Recomendaciones

Este proyecto se encuentra en estado Contratado en ejecución, a la fecha está al día con el cargue de información en los procesos de ejecución, precontractual y contractual.

Proyecto 27



Desarrollo de microrredes y almacenamiento (ess)
prestadores de servicios complementarios

Valor Total
\$ 3.942.973.233

Valor SGR
\$3.296.088.001




Código BPIN
2021000100523



Estado
Contratado en ejecución

AVANCE FÍSICO

13,11 %



AVANCE FINANCIERO

3,24 %

